УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Энерго"
_____ С.В. Макаров
31 августа 2017г.

ООО "Энерго"
Россия, 443035, г. Самара, ул. Минская, 25, тел. (846) 269-13-71, тел./факс (846) 956-45-25, e-mail: office@oooenergo.com
ОКПО 51866161, ОГРН 1026300771970, ИНН 6312038138, КПП 631201001

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА № 91

г. Самара «13» сентября 2017г.

Общество с ограниченной ответственностью «Энерго», в лице **директора Макарова С.В.**, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и , в лице **директора** , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, **заключили настоящий договор о нижеследующем:**

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 По настоящему договору «Подрядчик» по заданию «Заказчика» принимает на себя обязательства в установленный срок выполнить собственными силами, механизмами, автотранспортом и давальческим материалом «Заказчика» следующие работы: СМР по прокладке кабельной линии кабелем АСБ-10 3*185, последующее благоустройство территории в соответствии с приложением №1, приложением №2 к Договору подряда.

1.2. Вид, объем, стоимость, сроки и место выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, оговаривается сторонами в отдельных «Дополнительных соглашениях на выполнение работ», заключаемых в рамках настоящего договора.

1.3. Работа по прокладке кабельной линии кабелем АСБ-10 3*185 выполняется в течении 20 календарных дней с даты получением Заказчиком разрешения на ведение работ ГАТИ. Стоимость определяется суммой актов фактически выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, принятых «Подрядчиком». Работа про благоустройству выполняется в течении 10 календарных дней с даты подписания актов приема работ по прокладке вышеуказанной кабельной линии, но не позднее 30.10.2017г.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 «Заказчик», получает разрешение на производство работ и протокол выездного рабочего совещания в ГАТИ по благоустройству и выдает копию разрешения и копию протокола выездного рабочего совещания Подрядчику до начала работ по прокладке кабельной линии кабелем АСБ-10 3*185.

В случае не предоставления Заказчиком протокола выездного рабочего совещания в ГАТИ при определении объема работ стороны руководствуются Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Самара, утвержденных Постановлением Главы г. Самары № 404 от 10.06.2008 г.

2.2 Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ после утверждения Заказчиком сметной документации. Давальческий материал выдается «Заказчиком» по адресу г.Самара, ул. Чекистов, д. 197. При предъявлении актов выполненных работ КС-2, КС-3 «подрядчик» также обязуется предоставить отчет об использовании давальческого материала.

2.3 Заказчик имеет право на любом этапе работ проверять ход и качество выполняемых работ.

2.4 В случае возникновения обстоятельств, которые делают невозможным исполнения обязательств по настоящему договору, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика в письменном виде.

2.5 В случае обнаружения недостатков, явившихся следствием некачественно выполненных Подрядчиком работ, Заказчик имеет право потребовать их исправления за счет Подрядчика.

2.6 Подрядчик после окончания работ по благоустройству закрывает разрешение в Инспекции по благоустройству по постоянной схеме.

2.7 Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору Субподрядчиков, оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком.

2.8 Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента письменного уведомления Подрядчика осуществляет приемку выполненных работ, либо при наличии возражений и замечаний со стороны Заказчика, он направляет Подрядчику мотивированный отказ. Приемка выполненных работ оформляется актом выполненных работ, подписанными сторонами.

При отказе одной из сторон от подписания акта, в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной настоящего договора при условии надлежащего уведомления стороны.

2.9 В случае, когда объемы отдельных видов работ по согласованию сторон уточняются (уменьшаются или увеличиваются) в процессе выполнения работ, стоимость договора определяется с учетом указанных уточнений сметной документации.

2.10 Подрядчик имеет право на продление сроков установленных в дополнительных соглашениях при нарушении Заказчиком п.2.1, п. 2.2. настоящего Договора, а так же в случае изменения объемов работ в порядке, предусмотренном п.2.9 договора.

2.11. Подрядчик обязуется провести исполнительную съемку кабельной линии. Состав работ: полевые работы, камеральная обработка результатов съемки, изготовление исполнительного чертежа, изготовление сравнительного чертежа, нанесение изменений и вновь построенных коммуникаций (КЛ) на носители фонда геодезических и картографических материалов инженерных изысканий в бумажном виде на жесткой основе, согласование с Департаментом Градостроительства и архитектуры г.о. Самара

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1 Окончательная стоимость работ по данному договору определяется на основании подписанных Заказчиком и Подрядчиком смет, актов приемки выполненных работ (формы КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (формы КС-3).

3.2 При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных Подрядчиком, условий оплаты труда работников Подрядчика, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе Заказчика выполнить это требование - расторжения договора в одностороннем порядке.

Существенным возрастанием стоимости материалов (работ) стороны договорились считать такое увеличение стоимости, если последнее повлекло удорожание строительства и стоимость работ превысила смету не менее чем на 5%.

Указанные изменения стоимости работ вносятся посредством направления письменного уведомления Заказчику с указанием обусловивших изменения причин.

Заказчик вправе в течение 5 (пять) календарных дней с даты получения уведомления Подрядчика отказаться от принятия изменений, направив письменное уведомление Подрядчику. Изменения считаются вступившими в силу, а настоящий договор, соответственно, измененным по истечении 5 (пять) календарных дней с даты получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика и неполучения Подрядчиком письменного отказа Заказчика от приемки изменений в установленный срок.

В случае отказа Заказчика в приемке изменений настоящий договор считается расторгнутым по истечении 5 (пять) календарных дней с даты получения Заказчиком уведомления Подрядчика, что не освобождает Заказчика от оплаты Подрядчику суммы за фактически произведенные работы, подтвержденные согласованным актом выполненных работ по форме КС-2.

3.2. Расчет за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ, производится Заказчиком на основании подписанных Заказчиком следующих документов:
- акта приемки выполненных работ по форме КС-2
- справки о стоимости выполненных работ по форме КС—3
- счета фактуры на стоимость выполненных работ
- счета на оплату этапа работ

3.3. Расчет производится в течение 180 (Ста восьмидесяти) банковских дней после подписания документов, указанных в пункте 3.2. договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. По согласованию сторон возможны иные формы расчетов, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1 В случае несвоевременной оплаты работ по настоящему договору Подрядчик имеет право на получение от Заказчика пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

4.2 При необоснованной задержке начала выполнения работ, установленного «Дополнительным соглашением на выполнение работ», Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости общего объема работ по указанному соглашению за каждый день просрочки.

4.3 В случае нарушения установленного «Дополнительным соглашением на выполнение работ» срока окончания работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненного объема работ за каждый день просрочки.

4.4 Пункты 4.1 - 4.3 вступают в силу после предъявления письменной претензии одной из сторон.

4.5 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

4.6 Подрядчик несет гарантийное обязательство на асфальтобетонное покрытие в течение 24 месяцев со дня сдачи объекта, кроме случаев, когда разрушение асфальтобетонного покрытия вызвано действием третьих лиц или аварийным прорывом подземных коммуникаций.

4.7 Подрядчик не несет ответственность за провал асфальтобетонного покрытия в случае обратной засыпки траншеи силами Заказчика.

4.8. Приемка работ Заказчиком происходит поэтапно.

Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются по форме КС-2 "Акт о приемке выполненных работ", подписываемых Заказчиком в отношении работ, выполненных Подрядчиком за отчетный месяц. При этом акт КС-2 является актом приемки результата отдельного этапа работ.

Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке, в пятидневный срок передать подписанный акт КС-2 или замечания по выполненным работам Подрядчику. В случае не получения обоснованных замечаний по выполненным работам в 5-ти дневный срок, работы считаются принятыми и Подрядчик имеет право подписать акт в одностороннем порядке.

4.9. Стороны условились о том, что документы, которыми они будут обмениваться в процессе выполнения настоящего договора, переданные по факсимильной связи, признаются имеющими юридическую силу в следующих случаях:

- полученное по факсу сообщение признается достоверно исходящим от стороны по договору, если оно содержит отметки факсимильного аппарата стороны-отправителя с его наименованием и номером телефона;

- переданное по факсу сообщение подтверждается рапортом факсимильного аппарата стороны-отправителя, содержащего сведения о приеме сообщения стороной-получателем.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс-мажор)

5.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, актов государственных органов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

5.2 Срок действия обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствий, вызванных этими обстоятельствами.

6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1 Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полной приемки работ Заказчиком с оформлением всех необходимых документов.

6.2 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Приложения к настоящему договору:
Приложение № 1 Схема-Техническое задание на выполнение СМР по прокладке кабельной линии кабелем АСБ-10 3х185 мм^2
Приложение № 2 Схема – Техническое задание на выполнение благоустройства после прокладки кабельной линии

7.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик:		**Заказчик:**	
			ООО "Энерго"
Адрес:		Адрес:	443035, г. Самара, ул. Минская, 25
Тел./факс:		Тел./факс:	(846) 269-13-71, (846) 956-45-25
E-mail:		E-mail:	office@oooenergo.com
Сайт:		Сайт:	www.oooenergo.com
ИНН		ИНН	6312038138
КПП		КПП	631201001
ОГРН		ОГРН	1026300771970
Банк:		Банк:	Поволжский банк ПАО «Сбербанк России» г.Самара в Самарском отделении №6991 ПАО «Сбербанк России»
БИК		БИК	043601607
Р/с		Р/с	40702810654400101989
К/с		К/с	30101810200000000607
ОКПО		ОКПО	51866161
ОКВЭД		ОКВЭД	40.10.2, 40.10.3, 40.10.5, 45.31, 45.34
ОКОПФ		ОКОПФ	12300
Директор		Директор	ООО "Энерго"
			С.В. Макаров
м.п.		м.п.	

Приложение №1
к договору подряда № 91 от 13.09.2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение СМР по прокладке кабельной линии кабелем АСБ-10 3х185 мм^2

№ п/п	Наименование	Содержание основных данных и требований к выполнению работ
1	Наименование объекта;	Кабельная линия 10 кВ от места врезки в сущ. кабели в районе ул. Дыбенко и ул. Авроры до проектируемой РТП-4х1000/10/0,4кВ ул. Съездовская
2	Местоположение объекта;	Самарская обл., г. Самара, в границах ул. Гаражной, Авроры, Съездовской, Саранской.
3	Требования к выполнению работ;	Выполнить прокладку кабельной линии кабелем марки АСБ-10 кВ 3х185 мм2 в соответствии с рабочей документацией по объекту: «Жилая застройка по адресу: г. Самара, в границах ул. Гаражной, Авроры, Съездовской, Саранской» шифр 3376-03-2017-ЭС.
4	Основные объемы работ в соответствии с проектом 3376-03-2017-ЭС;	1. Разработка траншеи – 245 м3. 2. Обратная засыпка траншеи песком– 81,69 м3. 3. Укладка кирпича в траншею – 1200 шт. 4. Укладка плитки ПЗК 360х480х15 мм – 835 шт. 5. Укладка плитки ПЗК 240х480х15 мм – 835 шт. 6. Прокладка трубы ПНД Ф 125 мм – 336 м. 7. Обратная засыпка траншеи грунтом– 163,38 м3. 8. Прокладка кабелей в траншее – 1420 м. 9. Прокладка кабелей в трубах – 540 м. 10. Прокладка кабеля по металлоконструкциям - 40 м. 11. Монтаж соединительных муфт – 8 шт. 12. Выполнение ГНБ по 4 трубы в каждом проколе 34 м и 21 м. Труба ПЭ SDR17 Ф125мм L1= 4х34=136 м, L2= 4х21=84 м. 13. Подготовка котлованов под ГНБ: 3х2х3м по ул. Дыбенко – 2 шт. 2х2х2м по ул. Съездовская – 2 шт.
5	Гарантийные обязательства	Гарантия на все виды работ не менее 3-х лет.
6	Дополнительные требования	Согласовать все производимые работы с эксплуатирующими и смежными организациями. Своевременно по мере образования, вывозить строительный мусор и иные отходы с места производства работ, не допуская их накопления на строительной площадке. Оформить в установленном порядке исполнительную документацию на все выполняемые работы. В случае замечаний при приемке работ со стороны ГАТИ, срок устранения - не более 3-х календарных дней. Поставляемые материалы и оборудование должны иметь

		сертификаты соответствия системы сертификации Госстандарта России и должны соответствовать ТУ ли ГОСТу на каждое наименование поставляемого изделия. Тип, марка используемых материалов и оборудования должны быть согласованы с ООО «Энерго».

Подрядчик:

Адрес:
Тел./факс:
E-mail:
Сайт:
ИНН
КПП
ОГРН
Банк:

БИК
Р/с
К/с
ОКПО
ОКВЭД
ОКОПФ

Директор

м.п.

Заказчик:

ООО "Энерго"

Адрес:	443035, г. Самара, ул. Минская, 25
Тел./факс:	(846) 269-13-71, (846) 956-45-25
E-mail:	office@oooenergo.com
Сайт:	www.oooenergo.com
ИНН	6312038138
КПП	631201001
ОГРН	1026300771970
Банк:	Поволжский банк ПАО «Сбербанк России» г.Самара в Самарском отделении №6991 ПАО «Сбербанк России»
БИК	043601607
Р/с	40702810654400101989
К/с	30101810200000000607
ОКПО	51866161
ОКВЭД	40.10.2, 40.10.3, 40.10.5, 45.31, 45.34
ОКОПФ	12300

Директор ООО "Энерго"

С.В. Макаров

м.п.

Комиссия	Должность	Подпись	Дата	Ф.И.О.
Председатель	Зам. директора по экономике		31.08.17	А.С. Мещеряков
Зам. председателя	Начальник ПТО		31.08.17	Д.В. Тарасов
Член комиссии	Зам. директора по правовым вопросам		31.08.17	А.П. Борисов
Член комиссии	Главный бухгалтер		31.08.17	С.С. Шматова
Член комиссии	Главный инженер		31.08.17	Д.С. Дементьев
Секретарь	Делопроизводитель		31.08.17	М.А. Губайдуллина
Организатор закупок	Инженер службы зам.директора по экономике		31.08.17	П.А. Белоусов

Приложение №1
к договору подряда № 91 от 13.09.2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение благоустройства после прокладки кабельной линии

№ п/п	Наименование	Содержание основных данных и требований к выполнению работ
1	Наименование объекта;	Кабельная линия 10 кВ от места врезки в сущ. кабели в районе ул. Дыбенко и ул. Авроры до проектируемой РТП-4х1000/10/0,4кВ ул. Съездовская
2	Местоположение объекта;	Самарская обл., г. Самара, в границах ул. Гаражной, Авроры, Съездовской, Саранской.
3	Основные виды работ по благоустройству;	1. Выполнить восстановление газонного покрытия грунта. 2. Выполнить восстановление асфальто-бетонного покрытия, автодорог и тротуаров. 3. Выполнить восстановление бордюрных камней.
4	Схема расположения объекта	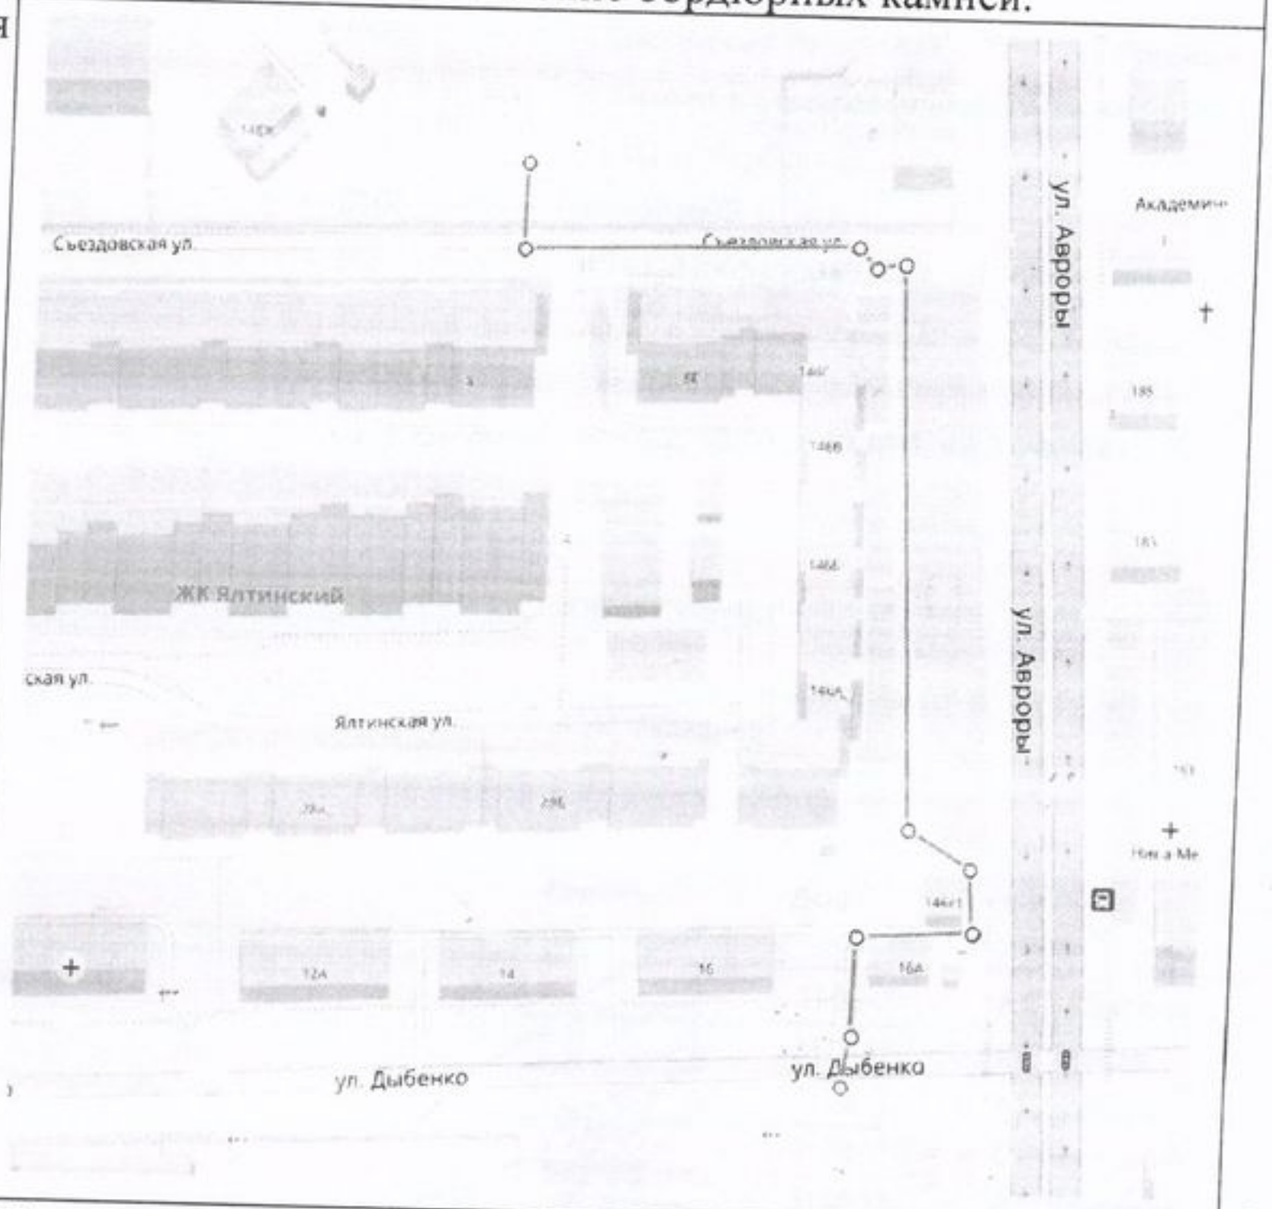
5	Гарантийные обязательства	Гарантия на асфальто-бетонное покрытие не менее 2-х лет.
6	Дополнительные требования	Согласовать все производимые работы с эксплуатирующими и смежными организациями. Своевременно по мере образования, вывозить строительный мусор и иные отходы с места производства работ, не допуская их накопления на строительной площадке. Оформить в установленном порядке исполнительную документацию на все выполняемые работы. В случае замечаний при приемке работ со стороны ГАТИ,

		срок устранения - не более 3-х календарных дней. Поставляемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия системы сертификации Госстандарта России и должны соответствовать ТУ ли ГОСТу на каждое наименование поставляемого изделия. Тип, марка используемых материалов и оборудования должны быть согласованы с ООО «Энерго».

Подрядчик:

Адрес:
Тел./факс:
E-mail:
Сайт:
ИНН
КПП
ОГРН
Банк:

БИК
Р/с
К/с
ОКПО
ОКВЭД
ОКОПФ

Директор

_____

м.п.

Заказчик:

ООО "Энерго"

Адрес:	443035, г. Самара, ул. Минская, 25
Тел./факс:	(846) 269-13-71, (846) 956-45-25
E-mail:	office@oooenergo.com
Сайт:	www.oooenergo.com
ИНН	6312038138
КПП	631201001
ОГРН	1026300771970
Банк:	Поволжский банк ПАО «Сбербанк России» г.Самара в Самарском отделении №6991 ПАО «Сбербанк России»
БИК	043601607
Р/с	40702810654400101989
К/с	30101810200000000607
ОКПО	51866161
ОКВЭД	40.10.2, 40.10.3, 40.10.5, 45.31, 45.34
ОКОПФ	12300

Директор ООО "Энерго"

_____ С.В. Макаров

Комиссия	Должность	Подпись	Дата	Ф.И.О.
Председатель	Зам. директора по экономике		31.08.17	А.С. Мещеряков
Зам. председателя	Начальник ПТО		31.08.17	Д.В. Тарасов
Член комиссии	Зам. директора по правовым вопросам		31.08.17	А.П. Борисов
Член комиссии	Главный бухгалтер		31.08.17	С.С. Шматова
Член комиссии	Главный инженер		31.08.17	Д.С. Дементьев
Секретарь	Делопроизводитель		31.08.17	М.А. Губайдуллина
Организатор закупок	Инженер службы зам.директора по экономике		31.08.17	П.А. Белоусов
